


# Relatório GT Mitigação e Desocupação

15/03/2024

**EAF**



CRIADA CONFORME  
DETERMINAÇÃO  
DA ANATEL

# FSS – Mitigação



## Mitigação Preventiva

Data-base: 12/03/2024

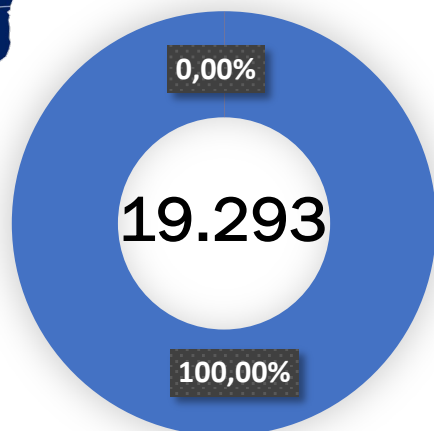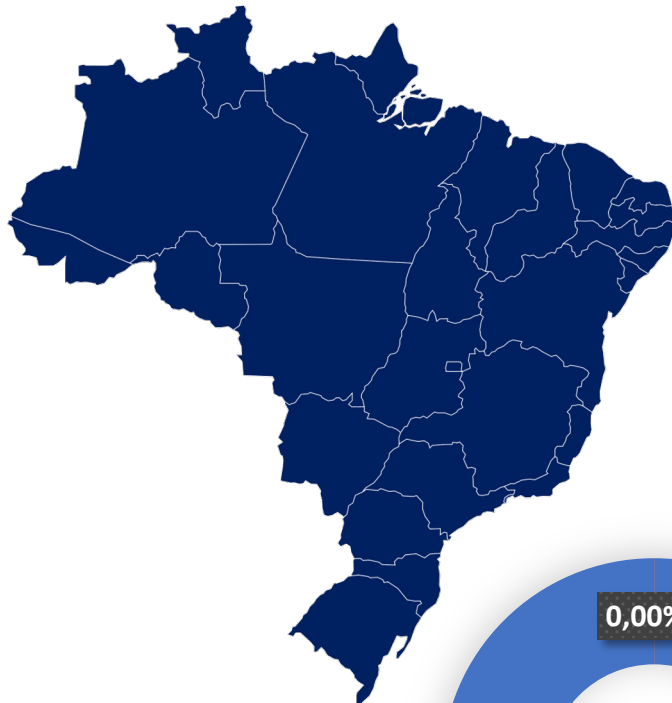

■ 19.293 CONCLUÍDAS

■ 0 A CONCLUIR

STATUS – EDITAL

### FASE I (capitais)

27 Municípios

100%

### FASE II (>500k)

26 Municípios

100%

### FASE III (>200k)

102 Municípios

100%

### FASE IV (>100k)

171 Municípios

100%

### FASE V (>30k)

848 Mun.

100%



### CIDADES MENOS DE 30K

4.396 Municípios

100%

**EA**F

# FSS - Desocupação

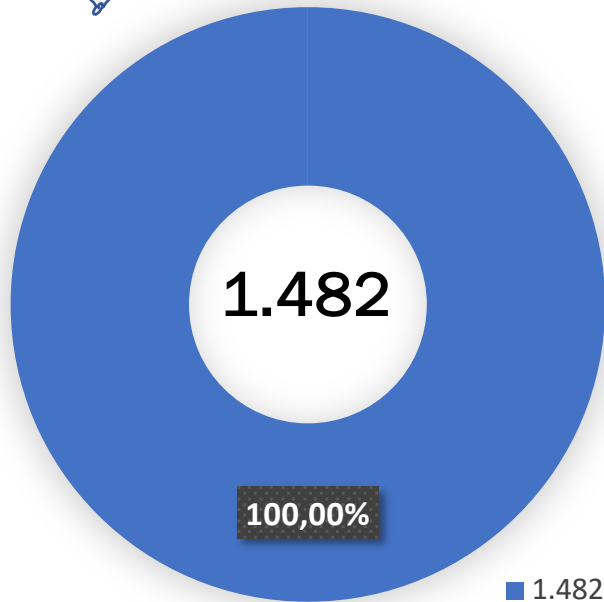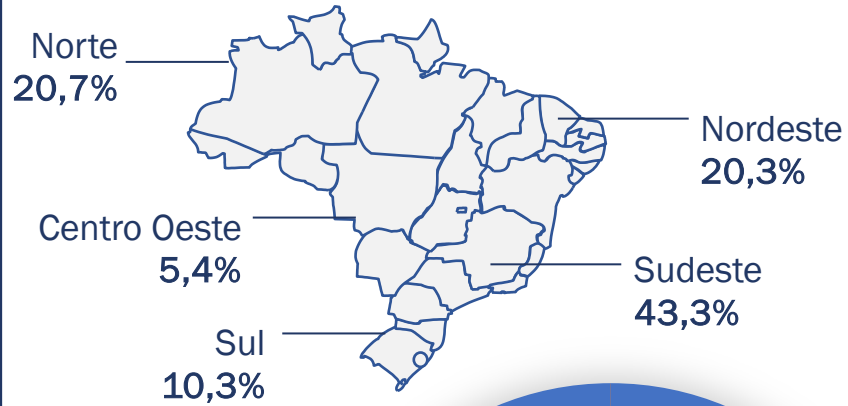

1.482

100,00%

■ 1.482 CONCLUIDOS

■ 0 A CONCLUIR



STATUS - EDITAL

## FASE I (capitais)

216 Estações

100% Concluído

## FASE II (>500k)

46 Estações

100% concluído

## FASE III (>200k)

195 Estações

100% concluído

## FASE IV (>100k)

185 Estações

100% concluído

## FASE V (>30k)

457 Estações

100% concluído

## CIDADES MENOS DE 30K

383 Estações

100% concluído

- 100% concluído em Julho/2023
- Atualização do cadastro Anatel em andamento

EAFF
