

Relatório Mitigação e Desocupação

28/03/2025

EAF


CRIADA CONFORME
DETERMINAÇÃO
DA ANATEL

FSS – Mitigação



Mitigação Preventiva

Data-base: 28/03/2025

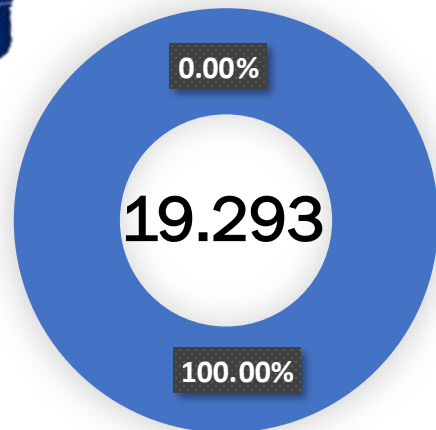

■ 19.293 CONCLUIDAS ■ 0 A CONCLUIR

STATUS – EDITAL

FASE I (capitais)

27 Municípios

100%

FASE II (>500k)

26 Municípios

100%

FASE III (>200k)

102 Municípios

100%

FASE IV (>100k)

171 Municípios

100%

FASE V (>30k)

848 Mun.

100%



CIDADES MENOS DE 30K

4.396 Municípios

100%

EEAF

FSS - Desocupação

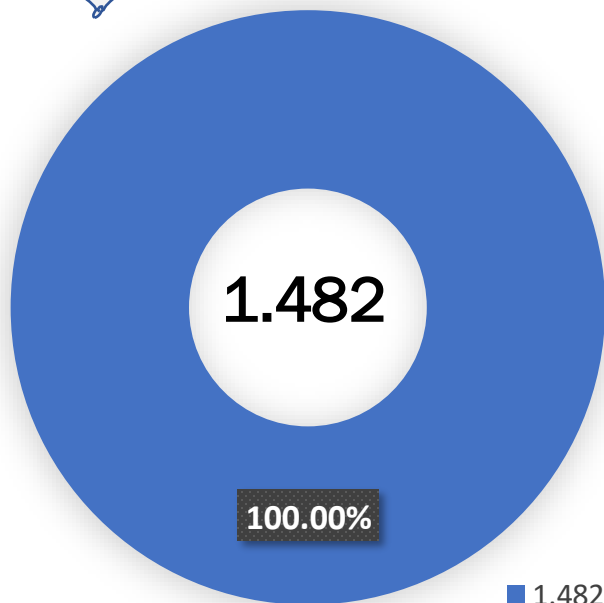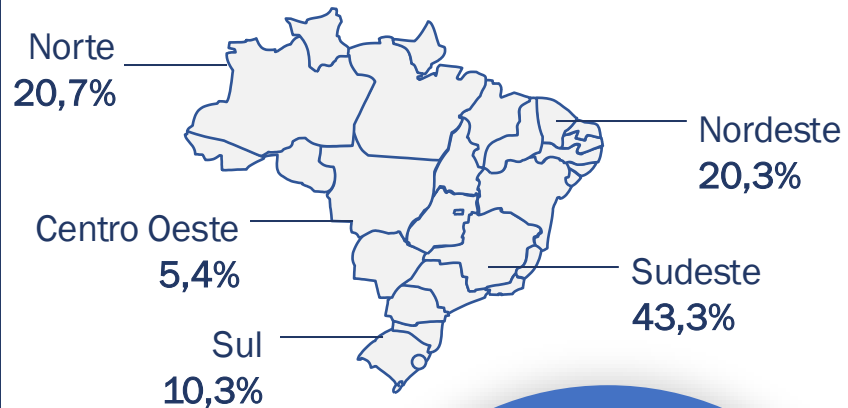

STATUS - EDITAL

FASE I (capitais)

216 Estações

100% Concluído

FASE II (>500k)

46 Estações

100% concluído

FASE III (>200k)

195 Estações

100% concluído

FASE IV (>100k)

185 Estações

100% concluído

FASE V (>30k)

457 Estações

100% concluído

CIDADES MENOS DE 30K

383 Estações

100% concluído

- 100% concluído em Julho/2023
- Atualização do cadastro Anatel em andamento

EAFA
