



ANUÁRIO GAISPI 2025 – 2026

Avaliação anual da adequação das atividades
da EAF aos seus objetivos

Art. 3º, XXIV, do Regimento Interno do GAISPI – Portaria Anatel nº 2.774/2024



Identificação institucional

Campo	Informação
Título	Anuário GAISPI 2025-2026
Natureza	Avaliação anual de que trata o art. 3º, XXIV, do Regimento Interno do GAISPI, em forma consolidada
Destinatário	Conselho Diretor da Anatel
Ciclo de referência	Julho de 2025 a julho de 2026, precedido de capítulo histórico (2022-2025)
Responsável	Presidência do GAISPI
Entidade avaliada	EAF – Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz
Base normativa	Edital nº 1/2021-SOR/SPR/CD-Anatel; Portaria Anatel nº 2.774/2024; Estatuto Social da EAF (AGE de 16/12/2025)
Processo SEI	53500.085834/2026-50

Apresentação do Presidente do GAISPI

O presente Anuário dá cumprimento, em forma consolidada, ao dever regimental de enviar anualmente, ao Conselho Diretor, da Anatel a avaliação da adequação das atividades da Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz – EAF – aos seus objetivos, nos termos do art. 3º, inciso XXIV, do Regimento Interno do GAISPI.

Trata-se de documento de governança e de prestação de contas, não de promoção institucional. O GAISPI não executa: acompanha, delibera sobre diretrizes e critérios, determina parâmetros, audita e atesta resultados. A execução das obrigações do Edital do 5G é de responsabilidade da EAF, entidade privada sem fins lucrativos, dotada de autonomia de gestão, cujas atividades este Grupo fiscaliza sob a modalidade de controle finalístico e paramétrico.

O ciclo 2025–2026 foi marcado por dois movimentos estruturantes: o fortalecimento da governança da própria EAF, por meio da reforma de seu Estatuto Social, com a instituição de Conselho Deliberativo e de Conselho Fiscal independentes das associadas; e a verificação conclusiva do adimplemento das obrigações de migração TVRO e de desocupação da faixa por estações FSS, que permitiu a liberação de garantias do certame na ordem de R\$ 3,9 bilhões, com a preservação prudencial de recursos para as etapas remanescentes.

As obrigações acompanhadas por este Grupo constituem compromissos de Estado, assumidos no âmbito de certame público, cuja execução transcende ciclos de governo. É sob essa perspectiva – de continuidade institucional, impessoalidade e interesse público – que este Anuário registra o que foi acompanhado, verificado e deliberado.

Presidência do GAISPI – Brasília, 2026

Nota metodológica

Período de referência e estrutura

O Anuário organiza-se em duas partes. A Parte I – Histórico e Contexto (2022–2025) tem natureza descritiva e contextual: narra a origem do Edital do 5G, a criação do GAISPI e da EAF e as entregas do período inicial, sem caráter avaliativo ou certificador. A Parte II – Ciclo 2025–2026 constitui o núcleo do documento e contém a avaliação regimental propriamente dita, o inventário dos atos do GAISPI e a posição das entregas acompanhadas no período de julho de 2025 a julho de 2026.

Fontes

As fontes documentais estão relacionadas ao final e compreendem atas e despachos do GAISPI, ofícios expedidos, relatórios da EAF, manifestações das Superintendências da Anatel e atos normativos de regência. Documentos com restrição de acesso constam dos inventários, mas sua reprodução observa a triagem indicada na nota dos Anexos.

Classificação probatória dos resultados

Todos os resultados referidos neste Anuário são classificados segundo o respectivo nível de verificação:

- **Nível A – Atestado pelo GAISPI:** resultado objeto de atesto formal do Grupo, com suporte em auditoria independente e evidências regulatórias;
- **Nível B – Deliberado ou homologado pelo GAISPI:** diretrizes, critérios, determinações e demais atos parametrais formalmente adotados pelo colegiado;
- **Nível C – Reportado pela EAF:** indicadores operacionais e quantitativos oriundos de relatórios da entidade executora, apresentados sem certificação pelo GAISPI.

A classificação materializa a separação entre fiscalizador e fiscalizado: o GAISPI não assume como próprios os números da execução; verifica-os nos limites de sua competência finalística.



01.

HISTÓRICO E CONTEXTO

(2022-2025)

Capítulo descritivo e contextual, sem caráter avaliativo ou certificador.
Indicadores conforme reportado pela EAF (Nível C), salvo indicação diversa.

1. Contexto regulatório: o Edital do 5G e a faixa de 3,5 GHz

Em 2021, a Anatel realizou a licitação da faixa de 3,5 GHz (Edital nº 1/2021-SOR/SPR/CD-Anatel), viabilizando a implantação do 5G no Brasil. O certame estabeleceu, entre os compromissos das proponentes vencedoras, a mitigação das interferências decorrentes do uso da faixa sobre a recepção gratuita de sinais de televisão aberta por meio de antenas parabólicas em Banda C (TVRO) e sobre os serviços prestados por estações do Serviço Fixo por Satélite (FSS).

A faixa era intensamente utilizada para recepção doméstica de TV aberta e gratuita – principal meio de acesso à televisão para milhões de famílias, sobretudo de baixa renda e em localidades sem cobertura terrestre adequada. A ativação do 5G na faixa criava risco concreto de interrupção desse acesso.

A solução desenhada no Edital estruturou-se em dois planos: a constituição da EAF – Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz, associação privada sem fins lucrativos integrada pelas proponentes vencedoras dos lotes nacionais, responsável por operacionalizar a migração da recepção para a Banda Ku e as demais obrigações associadas; e a instituição do GAISPI, colegiado presidido pela Anatel e integrado por representantes do Ministério das Comunicações e demais atores indicados no Edital, ao qual coube o acompanhamento da implantação das soluções.

Elemento	Definição
Edital nº 1/2021	Licitação da faixa de 3,5 GHz – obrigações de mitigação e projetos associados
Banda C (TVRO)	Recepção gratuita de TV aberta por parabólicas convencionais
Banda Ku	Faixa de destino da migração da recepção doméstica
FSS	Serviço Fixo por Satélite – estações profissionais remanejadas e/ou mitigadas
EAF	Entidade executora das obrigações – associação privada sem fins lucrativos
GAISPI	Instância colegiada de acompanhamento – controle finalístico e paramétrico

2. O papel do GAISPI: natureza do controle exercido

O GAISPI não executa e não gere. Sua atuação é de natureza finalística e paramétrica: fixa diretrizes, critérios e especificações adicionais nas hipóteses previstas no Edital e em seu Regimento Interno; acompanha e monitora a execução por meio de relatórios, indicadores e cronogramas; realiza auditorias sobre as atividades da EAF (art. 3º, XXVI, do RI); e verifica o adimplemento das obrigações, atestando resultados quando cabível. A aprovação prévia de atos de gestão da EAF não integra suas competências – reserva que preserva a autonomia da entidade executora e a higidez do modelo desenhado no certame.

Função	Descrição
Acompanhamento	Monitoramento contínuo do andamento das obrigações, com base em relatórios periódicos, indicadores e cronogramas
Deliberação parametral	Definição de diretrizes, critérios técnicos e especificações adicionais nas hipóteses do Edital e do Regimento Interno
Fiscalização e auditoria	Auditorias sobre as atividades operacionais, comerciais, administrativas e financeiras da EAF, a qualquer tempo
Verificação de adimplemento	Análise de evidências e atesto de cumprimento de obrigações, com suporte em auditoria independente
Coordenação institucional	Articulação entre Anatel, MCom, EAF, prestadoras, radiodifusores e exploradoras de satélite
Prestação de contas	Avaliação anual ao Conselho Diretor (art. 3º, XXIV) e publicidade das atas e atos do colegiado

O GAISPI fixa parâmetros e verifica resultados; a EAF decide e executa.

3. Linha do tempo do período histórico (2022-2025)

2022

Constituição da EAF. Início do Siga Antenado. Escolha dos canais a serem migrados da banda C para banda Ku. Diretriz de desocupação da faixa 3.625 MHz a 3.700 MHz. Diretriz da migração da TVRO da banda C para banda Ku e especificação técnica dos kits dos receptores Banda Ku. Diretriz para mitigação das estações FSS que operam na faixa de 3.700 a 4.200 MHz. Estruturação logística e da central de atendimento multicanal.

2023

Expansão nacional do Siga Antenado: centros regionais de distribuição e ampliação da rede de instaladores. Início da agenda de sustentabilidade. Finalização da desocupação da faixa 3.525 MHz a 3.700 MHz das estações terrenas (jul/2023). Diretriz de implantação das Infovias 02, 03 e 04 no Programa Amazônia Integrada Sustentável (PAIS).

2024

Aceleração do Siga Antenado: comunicação regionalizada e primeiras ações estruturadas de descarte responsável. Finalização da mitigação preventiva das estações terrenas (mar/2024): liberação de todos os municípios para implantação do 5G. Deliberação para reinstalação de Kits para os beneficiários afetados no Rio Grande do Sul (jul/2024). Deliberação para início do projeto da rede privativa fixa, com faseamento associado à lista de pontos enviada pelo MCOM. Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica MCOM, Anatel e ABIN para o eixo de Criptografia da Rede Privativa.

2024

Infovia 03 - Conclusão da implantação da rota expressa Macapá/AP - Belém/PA fase 1. Infovia 04 - Conclusão da implantação do trecho subaquático Vila de Moura/AM - Caracará/RR. Início da implantação da rede privativa fixa, com a aprovação dos pontos informados pelo MCom, associados ao planejamento da Telebras. Início da implantação da rede privativa móvel, com a aprovação do projeto e faseado de acordo com Nota Técnica do MCom.

2025 até Jun.

Finalização do Siga Antenado (jun/2025). Aprovação da Fase Extra (Brasil Antenado) na 39ª RO realizada em 21/05/2025. Início da execução do Brasil Antenado (julho/2025). Edital de Apoio à Gestão de Resíduos Eletrônicos. Projeto Terra Preta. Preparação da participação na COP30.

2025 após Jul.

Diretriz de Implantação das Infovias 05, 06 e 08. Infovia 02 - Conclusão da implantação do trecho subaquático Tefé/AM - Benjamin Constant/AM. Infovia 04 - Conclusão da implantação do trecho terrestre Caracará/RR - Boa Vista/RR. Infovia 03 - Conclusão da implantação das rotas ramificadas Macapá/AP - Afuá/PA e Belém/PA - Ponta de Pedras/PA fase 2. Infovia 02 - Conclusão da implantação completa do trecho Tefé/AM - Atalaia do Norte/AM. Adequação do PAC - Conclusão dos lançamentos subaquáticos de trechos em Manaus/AM e Manacapuru/AM - Tefé/AM. Diretriz de transferência das infraestruturas do PAIS. Realização dos Estudos de Rota Brasil - Colômbia. Aprovação do Projeto Revitalização do PAC. Deliberada a prorrogação dos prazos de entrega dos Projetos PAIS (jun/28) e Rede Privativa de Governo (dez/27).

4. Síntese das entregas do período histórico

Desocupação e mitigação de estações FSS

As 1.482 estações FSS que utilizavam a faixa de frequência de 3.625 MHz a 3.700 MHz foram remanejadas (desocupadas) para outras faixas em julho/2023, e 18.741 estações FSS tiveram atuação da EAF para atender as diretrizes de mitigação (Nível C).

4.1. Siga Antenado migração TVRO

A operação nacional de migração da recepção doméstica alcançou mais de 5 milhões de famílias beneficiadas, com atuação em todos os 5.570 municípios brasileiros, envolvendo especificação técnica de receptores, homologação de equipamentos junto a laboratórios credenciados, cadeia logística nacional e central de atendimento multicanal (Nível C).

4.2. Brasil Antenado inclusão em territórios vulneráveis

O programa distribuiu gratuitamente mais de 250 mil kits em 323 municípios de 16 estados, priorizando famílias de baixa renda em localidades com baixa disponibilidade do serviço de televisão terrestre que consequentemente também tende a ter menor grau de conectividade, com mobilização territorial presencial e pesquisas junto aos beneficiários (Nível C).





4.3. Infovias Amazônicas etapa inicial

No âmbito do Programa Amazônia Integrada e Sustentável (PAIS), integrante do Norte Conectado, a EAF implantou infraestrutura óptica subfluvial na região amazônica.

A Etapa 01 (Infovias 02, 03 e 04) encontra-se integralmente concluída, com transferências ao Ministério das Comunicações em curso (Infovia 02) ou concluídas (Infovias 03 e 04), cujo detalhamento e posição atualizada constam da Parte II deste Anuário.

4.4. Rede Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal

No período histórico considerado, destacam-se dois marcos relacionados ao projeto da rede privativa, quais sejam: a deliberação do GAISPI autorizando o início do projeto da rede privativa fixa, tendo como subsídio o envio da lista de pontos pelo MCOM, compreendendo a implementação dos pontos em fases, e a deliberação para início do projeto da rede privativa móvel, utilizando faseamento definido em Nota Técnica do MCOM de acordo com os produtos a serem entregues.



4.5. Observação sobre o período histórico

Os fatos e indicadores desta Parte I são apresentados a título de contexto. A avaliação regimental contida na Parte II refere-se ao ciclo 2025-2026 e não implica certificação retroativa dos atos e resultados do período histórico, que permanecem sujeitos aos instrumentos ordinários de fiscalização e controle.



02.

CICLO 2025-2026 (JULHO/2025 JULHO/2026)

Núcleo do Anuário: avaliação regimental, atos parametrais
e posição das entregas acompanhadas.

5. Transição de gestão e continuidade institucional

Em 31 de outubro de 2025 consumou-se a transição na Presidência do GAISPI. O ciclo objeto deste Anuário abrange, portanto, o trimestre final da gestão anterior (julho a outubro de 2025) e a gestão iniciada em novembro de 2025. A avaliação regimental é do colegiado, e não de seus integrantes: os atos do trimestre inicial integram os inventários deste documento em igualdade de condições.

A partir da transição, a Presidência conduziu agenda de reforço dos mecanismos de controle finalístico, cujos marcos principais — a reestruturação da governança da EAF e a consolidação do regime de verificação de adimplemento — estarão descritos nos Capítulos 6 e 7 deste anuário.

Desde novembro de 2025, a EAF vem promovendo o fortalecimento contínuo de seu ambiente de controle, governança e integridade por meio da implementação de medidas estruturantes voltadas ao aumento da transparência, da rastreabilidade e da supervisão institucional.

Dentre as iniciativas adotadas, destacam-se a regulamentação dos procedimentos de fiscalização e acompanhamento das obrigações executadas pela EAF, o aprimoramento dos mecanismos de gestão de riscos e controles internos, o fortalecimento das atividades de auditoria e monitoramento, bem como a evolução do Programa de Integridade, abrangendo a revisão e ampliação de políticas e procedimentos, ações de treinamento e comunicação, aperfeiçoamento dos processos de Due Diligence e gestão de terceiros, além do reforço dos canais de denúncia e acolhimento.

Soma-se, a essas medidas, a criação do Conselho Deliberativo da EAF, instância colegiada responsável por analisar e deliberar sobre matérias estratégicas e contratações relevantes, conferindo maior segregação de funções, pluralidade no processo decisório, transparência e responsabilidades à governança da Associação.

Em conjunto, essas iniciativas reforçam o compromisso da EAF com as melhores práticas de governança corporativa, integridade, controle e prestação de contas.



6. Reestruturação da governança da EAF (Estatuto Social – AGE de 16/12/2025)

6.1. Risco estrutural identificado

No desenho original de governança da EAF, as associadas — proponentes vencedoras dos lotes nacionais do certame, aportantes dos recursos administrados pela entidade — detinham participação na gestão da associação. O GAISPI identificou, nesse arranjo, risco estrutural de conflito de interesses, considerando a possibilidade de celebração, pela EAF, de contratos e negócios envolvendo as próprias associadas ou gestores por elas indicados.

A identificação teve caráter preventivo e estrutural: tratou-se de aprimoramento do desenho institucional destinado a mitigar risco, no exercício da competência do GAISPI de zelar pela adequação das atividades da EAF aos seus objetivos.

6.2. Parâmetros fixados e reforma estatutária

Fixados os parâmetros de fortalecimento de governança pelo GAISPI, a EAF, por deliberação de sua própria Assembleia Geral, reformou o Estatuto Social, consolidado na Assembleia Geral Extraordinária de 16 de dezembro de 2025. O novo desenho institucional compreende:

- **Conselho Deliberativo (arts. 19 e 20):** órgão de 3 membros com reputação ilibada e independência em relação às associadas, indicados pela Presidência do GAISPI com ratificação pela Assembleia Geral, competente para aprovar orçamento, demonstrações financeiras, contratações relevantes e operações com partes relacionadas.
- **Conselho Fiscal (arts. 27 a 30):** órgão de fiscalização interna, com atribuições de parecer sobre contas, acompanhamento de auditorias e apontamento de indícios de erros ou fraudes.
- **Diretoria profissional independente (arts. 21 e 26):** diretores contratados no mercado, com vedação de eleição de quem mantenha relação de subordinação ou dependência com as associadas.
- **Controle de partes relacionadas (art. 20, xxii):** aprovação obrigatória, pelo Conselho Deliberativo, de operações com partes relacionadas à EAF, às associadas e aos membros dos órgãos estatutários.
- **Independência estrutural (art. 36):** estrutura administrativa, econômica, financeira e patrimonial independente das associadas.

6.3. Preservação da autonomia da entidade

O novo arranjo preserva integralmente a separação entre fiscalizador e fiscalizado. A indicação dos membros do Conselho Deliberativo pela Presidência do GAISPI é ratificada pela Assembleia Geral da própria EAF (art. 19, §2º), e o Estatuto impõe aos conselheiros o dever de atuar única e exclusivamente no interesse da EAF — vedando-lhes faltar a esse dever ainda que para defesa de interesse das associadas ou do próprio GAISPI (art. 20, §2º). O Conselho Deliberativo presta contas diretamente ao GAISPI (art. 20, §3º), fechando o ciclo de accountability sem transferência da gestão.

Elemento	Referência
Conflito de interesse pontuado por decisão do Conselho Diretor da Anatel	Acórdão nº 294, de 29 de outubro de 2025 – SEI nº 14650802
Solicitação de providências da Assembleia Geral diante de conflito de interesse evidenciado no processo decisório da EAF.	Ofício nº 38/2025/GAISPI-ANATEL – SEI nº 14871140
Proposta de alteração estatutária da EAF – solicitação de cronograma para deliberação e implementação do novo Estatuto Social.	Ofício nº 41/2025/GAISPI-ANATEL – SEI nº 14883503
Realização de Assembleia Geral Extraordinária, em 16/12/2025, para a aprovação da alteração do Estatuto Social da EAF.	Carta EAF 256/2025 – SEI nº 14943842 Novo Estatuto da EAF – SEI nº 14943843 Protocolo do registro do novo estatuto social – SEI nº 14943844
Protocolo de pedido de registro em cartório, no dia 18/12/2025, da ata da AGE aprovando o novo Estatuto Social da EAF.	
Indicação de membros do Conselho Deliberativo – Estatuto Social da EAF	Ofício nº 42/2025/GAISPI-ANATEL – SEI nº 14948611
No dia 19/12/2025: • Realização de Assembleia Geral Extraordinária para formalização da posse dos 3 membros do Conselho Deliberativo (CD) que foi eleito pelas associadas. • Reunião do Conselho Deliberativo para eleição do Diretor Geral nos termos do artigo 20, inciso (ii) do novo Estatuto Social, conforme previamente aprovado pelo GAISPI.	Ata da Assembleia Geral Extraordinária a eleição do Diretor Geral – SEI nº 15232865 Ata da Assembleia Geral Extraordinária para a formalização do novo CD – SEI nº 15232866

7. Atestos de cumprimento e liberação de garantias do certame

7.1. Objeto e natureza do ato

Em 26 de junho de 2026, o GAISPI atestou o cumprimento integral das obrigações de migração da recepção TVRO e de desocupação da faixa por estações do Serviço Fixo por Satélite (FSS), com suporte em auditoria independente e no conjunto de evidências regulatórias reunidas ao longo do acompanhamento (Nível A). O atesto viabilizou o deferimento, pela Superintendência de Controle de Obrigações — SCO, da liberação de garantias apresentadas no certame pelas proponentes vencedoras, na ordem de R\$ 3,9 bilhões.

O ato sintetiza a natureza do controle exercido pelo Grupo: verificação finalística de resultados, mediante evidências e auditoria independente, sem ingerência nos meios de execução.

7.2. Salvaguardas prudenciais

Na mesma deliberação, o GAISPI determinou à EAF a preservação de recursos para o custeio da Fase C do Programa Brasil Antenado e para as atividades de mitigação reativa de eventuais interferências em estações FSS, assegurando que a liberação das garantias não comprometesse as etapas remanescentes das obrigações.

Elemento	Referência
Reuniões que aprovaram os atestos	Atesto FSS: Registro da 41ª RO - 23/07/2025 (SEI nº 14062938) Atesto TVRO: Registro da 42ª RO - 29.08.2025 (14402195)
Despacho de ratificação	Despacho Decisório nº 2/2026/GAISPI (SEI nº 15397158)
Relatórios de auditoria independente	Carta EAF nº 299/2026 - Encaminhamento dos relatórios de PPA para evidenciar o cumprimento dos compromissos previstos no Edital do 5G (SEI nº 15647209) Relatório nº 258QI-013-PB - Processo de avaliação e aderência da TVRO (SEI nº 15647210) Relatório nº 2558J-035-PB - Processo de Avaliação e aderência do FSS (SEI nº 15647211)
Manifestação da SCO e atos de deferimento	Tim S.A.: - Manifestação: Informe 295/2026/COGE/SCO (SEI 15461918). - Ato de Deferimento: Despacho Decisório 260/2026/COGE/SCO (SEI 15475857): relativo ao item 1.1 do Anexo IV-A do Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL. Telefônica Brasil S.A.: - Manifestação: Informe 351/2026/COGE/SCO (SEI 15541860) - Ato de Deferimento: Despacho Decisório 368//2026/COGE/SCO (SEI 15735731): relativo aos itens 1.1 e 1.2 do Anexo IV-A do Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL. Claro S.A.: - Manifestação: Informe 471/2026/COGE/SCO (SEI 15769830) - Ato de Deferimento: Despacho Decisório 417/2026/COGE/SCO (SEI 15861442): relativo aos itens 1.1 e 1.2 do Anexo IV-A do Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL.
Valores liberados por proponente	Tim S.A. - R\$ 1.191.262.613,50 Telefônica Brasil S.A. - R\$ 1.399.313.632,58 Claro S.A. - R\$ 1.322.539.851,06
Determinação de reserva (Fase C / FSS reativa)	Registro da 41ª RO - 23/07/2025 (SEI nº 14062938) - Reserva de valores para mitigação reativa FSS Registro da 42ª RO - 29/08/2025 (SEI nº 14402195) - Fase Extra TVRO

8. Atos parametrais do ciclo: decisões e deliberações

O quadro a seguir consolida as deliberações formais do GAISPI no ciclo de referência, na forma do Inventário II do Memorando de Instrução. Somente atos formalmente deliberados pelo colegiado integram este rol; apresentações informacionais e relatos técnicos registrados em ata não constituem deliberação.

Nº	Reunião/ Documento	Data	Deliberação (ementa)	Nº SEI
01	Portaria nº 3010	31/07/2025	Diretrizes para Transferência das Infraestruturas no Âmbito do Programa Amazônia Integrada e Sustentável - PAIS	14114291
02	45ª RO	19/12/2025	Homologação das Diretrizes de Criptografia da Rede Privativa	14997374 15936242
03	45ª RO	19/12/2025	Autorização à EAF para análise técnica e estimativa de custos do backbone da Telebras (Ofício MCOM nº 42.698/2025)	14997374
04	48ª RO	30/03/2026	Nova sistemática de assinatura das atas (Presidente e Secretário Executivo)	15441756
05	41ª RO 42ª RO	26/03/2026	Atesto de cumprimento TVRO/FSS e liberação de garantias; reserva Fase C / FSS reativa - Despacho Decisório nº 2/2026/GAISPI (SEI nº 15397158)	14062938 14402195
06	50ª RO	12/06/2026	Aprovação do Estudo sobre a modernização do backbone da Telebras, apresentado pela EAF, com a indicação dos cenários mais adequados.	15838570

9. Ofícios expedidos no ciclo

Consolidação dos ofícios expedidos pelo GAISPI e por sua Presidência no ciclo de referência, na forma do Inventário I do Memorando de Instrução, com indicação da base regimental de cada ato.

Nº	Reunião	Data	Destinatário	Objeto (síntese)	Nº SEI
01	16/2025/GAISPI-ANATEL	22/07/2025	EAF	Solicitação de subsídios para resposta à demanda do Chefe do Serviço de Telecomunicações e Comunicação Crítica da Polícia Federal sobre a rede privativa de comunicação da administração pública federal	14037879
02	17/2025/GAISPI-ANATEL	22/07/2025	EAF	Solicitação de subsídios para resposta à demanda da SSP-GO sobre a rede privativa de comunicação da administração pública federal	14037991
03	18/2025/GAISPI-ANATEL	30/07/2025	EAF	Solicita informações Técnicas Complementares (novas datas de conclusão dos projetos PAIS e Redes Privativas)	14098277
04	19/2025/GAISPI-ANATEL	21/08/2025	SSP-GO	Envio das informações fornecidas pela EAF sobre a Rede Privativa de Comunicação Administração Pública Federal	14157023
05	20/2025/GAISPI-ANATEL	21/08/2025	Superintendência Regional de Polícia Federal no Distrito Federal	Envio das informações fornecidas pela EAF sobre a Rede Privativa do Governo Federal	14157364
06	21/2025/GAISPI-ANATEL	14/08/2025	DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes	Instalação de cabo subaquático do Projeto Norte Conectado	14161739
07	22/2025/GAISPI-ANATEL	16/09/2025	EAF	Solicita subsidios em relação à demanda da Defensoria Pública da União formalizada por meio do Ofício nº 8207255/2025-OFGE2 CARUARU	14210913
08	23/2025/GAISPI-ANATEL	27/08/2025	EAF	Solicita informações Técnicas Complementares em relação às novas datas de conclusão dos projetos PAIS e Redes Privativas	14267517
09	24/2025/GAISPI-ANATEL	28/08/2025	EAF	Notificação de Acórdão nº 242 (deliberou sobre o Pedido de autorização para a Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF) operacionalizar a adequação e recuperação das infovias do PAC-1 e PAC-2	14271886
10	25/2025/GAISPI-ANATEL	04/09/2025	EAF	Notificação de Acórdão 242 - solicita o envio dos estudos de viabilidade técnica e de estimativa de custos para a recuperação e adequação das demais infovias do Projeto Amazônia Conectada - PAC, mencionadas no Informe nº 9/2025/GAISPI	14325610
11	26/2025/GAISPI-ANATEL	17/09/2025	EAF	Encaminha informações solicitadas pelas Carta EAF 239/202 e Carta EAF 241/2025, referentes ao Acórdão nº 242	14341857

Nº	Reunião	Data	Destinatário	Objeto (síntese)	Nº SEI
12	27/2025/GAISPI-ANATEL	17/09/2025	EAF	Comunicação de decisão referente Acórdão nº 249 - autorizar a participação institucional da Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz - EAF na Casa Brasil Belém 2025, durante a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - COP 30	14384489
13	28/2025/GAISPI-ANATEL	01/10/2025	GPR	Encaminha informações acerca do projeto de interconexão de fibra óptica no trecho Manaus-Tabatinga	14480032
14	29/2025/GAISPI-ANATEL	10/10/2025	EAF	Solicita informações Técnicas Complementares sobre as novas datas de conclusão dos projetos PAIS e Redes Privativas	14542469
15	30/2025/GAISPI-ANATEL	13/10/2025	EAF	Solicita subsídios em relação ao Requerimento de Informação nº 6067/2025, por meio da qual o Sr. Deputado Federal Daniel Almeida requer informações acerca do programa Siga Antenado e da atuação da Entidade Administradora da Faixa (EAF)	14548883
16	31/2025/GAISPI-ANATEL	13/10/2025	EAF	Solicita subsídios para resposta ao Requerimento de Informação nº 6452/2025, por meio da qual o Sr. Deputado Federal Amom Mandel requer informações acerca do programa de Instalação Gratuita de Antenas Parabólicas	14549026
17	32/2025/GAISPI-ANATEL	13/10/2025	Defensor Público Federal	Envio de respostas do Ofício nº 8207255/2025-OFGE2 CARUARU à Defensoria Pública da União	14549176
18	33/2025/GAISPI-ANATEL	22/10/2025	EAF	Solicitação de esclarecimentos adicionais à EAF em relação à resposta encaminhada sobre o Requerimento de Informação nº 6067/2025, formulado pelo Sr. Deputado Federal Daniel Almeida	14612582
19	34/2025/GAISPI-ANATEL	22/10/2025	EAF	Solicitação de esclarecimentos adicionais para elaboração de resposta ao Requerimento de Informação nº 6452/2025 formulado pelo Sr. Deputado Federal Amom Mandel	14612647
20	36/2025/GAISPI-ANATEL	01/12/2025	Secretário de Comunicação Social Eletrônica do Min. das Comunicações	Envia o Termo de Declaração e Entrega – TDE, referente à Infovia 03 (Macapá-AP/Belém-PA) do Programa Amazônia Integrada e Sustentável – PAIS	14829677
21	37/2025/GAISPI-ANATEL	03/12/2025	EAF	Solicita subsídios para elaboração de resposta à Solicitação de Auditoria nº 04 da Controladoria-Geral da União (CGU)	14853270
22	38/2025/GAISPI-ANATEL	05/12/2025	EAF	Solicitação de providências da Assembleia Geral da EAF diante de conflito de interesse evidenciado no processo decisório da entidade	14871140
23	39/2025/GAISPI-ANATEL	09/12/2025	EAF	Solicitação de informações sobre todas as contratações realizadas desde a criação da EAF e comprovação de auditorias externas (privadas e governamentais)	14871322

Nº	Reunião	Data	Destinatário	Objeto (síntese)	Nº SEI
24	40/2025/GAISPA-ANATEL	08/12/2025	AUD	Solicitação de prazo adicional para encaminhamento das informações demandadas por meio da Solicitação de Auditoria nº 4 - CGU	14875215
25	41/2025/GAISPI-ANATEL	09/12/2025	EAF	Proposta de alteração estatutária da EAF - solicitação de prazo para deliberação e implementação	14883503
26	42/2025/GAISPI-ANATEL	19/12/2025	EAF	Indicação de membros do Conselho Deliberativo - Estatuto Social da EAF	14948611
27	43/2025/GAISPI-ANATEL	19/12/2025	EAF	Indicação de Diretora Estatutária Presidente da EAF - Estatuto Social	14950329
28	1/2026/GAISPI-ANATEL	07/01/2026	EAF	Proposta de remuneração dos novos membros do Conselho Deliberativo da EAF	15009038
29	2/2026/GAISPI-ANATEL	21/01/2026	EAF	Solicita subsídios para elaboração de resposta à Cota nº 00076/2026/PFE-ANATEL/PGF/AGU sobre ajuizamento de ação requerendo o fornecimento de kit de antena parabólica digital a uma cidadã	15025460
30	3/2026/GAISPI-ANATEL	23/01/2026	Secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações	Envio TDE referente à Infovia 04 (Vila de Moura/AM - Boa Vista/RR) do Programa Amazônia Integrada e Sustentável - PAIS	15036306
31	4/2026/GAISPI-ANATEL	04/02/2026	Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel	Encaminha as respostas à Cota nº 00076/2026/PFE-ANATEL/PGF/AGU sobre ajuizamento de ação requerendo o fornecimento de kit de antena parabólica digital a uma cidadã	15088605
32	5/2026/GAISPI-ANATEL	02/03/2026	EAF	Determinação de avaliação para implementação do Programa “Mil Talentos” com utilização de saldos das Infovias Amazônicas - Sustentabilidade Operacional e Formação Técnico-Profissional, considerando os conceitos aplicáveis ao ESG (Ambiental, Social e Governança)	15257028
33	6/2026/GAISPI-ANATEL	12/03/2026	EAF	Resposta ao pedido de prorrogação excepcional de prazo para apresentação de documentação trimestral	15296798
34	7/2026/GAISPI-ANATEL	11/03/2026	EAF	Solicitação de informações sobre a integridade e ambiente de trabalho na EAF	15311530
35	8/2026/GAISPI-ANATEL	11/03/2026	EAF	Solicitação de informações sobre eventuais despesas relacionadas a estudos técnicos referentes à evolução do backbone da Telebrás para suporte à Rede Privativa da Administração Pública Federal	15311704
36	10/2026/GAISPI-ANATEL	18/03/2026	EAF	Solicitação de avaliação quanto à viabilização transitória de transporte de dados entre Leticia (Colômbia) e Manaus (AM), no âmbito da Infovia 02 do PAIS	15351163
37	11/2026/GAISPI-ANATEL	27/03/2026	TELEBRAS	Pedido de informações sobre pleito da Telebras para compensação de custos operacionais incorridos com o link que interliga as redes legadas dos órgãos de segurança, apresentado por meio do Ofício nº 4735/2026/MCOM, de 26 de fevereiro de 2026	15359110

Nº	Reunião	Data	Destinatário	Objeto (síntese)	Nº SEI
38	12/2026/GAISPI-ANATEL	27/03/2026	EAf	Pedido de informações sobre pleito da Telebras para compensação de custos operacionais incorridos com o link que interliga as redes legadas dos órgãos de segurança, apresentado por meio do Ofício nº 4735/2026/MCOM, de 26 de fevereiro de 2026	15359148
39	13/2026/GAISPI-ANATEL	19/03/2026	EAf	Deferimento de pedido de prorrogação para envio das informações referentes à integridade e ambiente de trabalho	15359184
40	14/2026/GAISPI-ANATEL	25/03/2026	EAf	Deferimento de pedido de prorrogação sobre informações sobre eventuais despesas relacionadas a estudos técnicos referentes à evolução do backbone da Telebrás para suporte à Rede Privativa	15385557
41	15/2026/GAISPI-ANATEL	26/03/2026	SCO	Notificação do Despacho Decisório nº 02/2026/GAISPI	15397353
42	16/2026/GAISPI-ANATEL	26/03/2026	EAf	Notificação do Despacho Decisório nº 02/2026/GAISPI	15397444
43	17/2026/GAISPI-ANATEL	16/04/2026	EAf	Deferimento de pedido de prorrogação de prazo sobre avaliação para implementação do Programa “Mil Talentos” com utilização de saldos das Infovias Amazônicas	15498297
44	18/2026/GAISPI-ANATEL	15/05/2026	EAf	Solicita subsídios para elaboração de resposta aos questionamentos formulados pelo TCU por meio do Ofício 17529/2026-TCU/Seproc	15645420
45	19/2026/GAISPI-ANATEL	22/05/2026	EAf	Solicita a adoção das providências cabíveis visando viabilizar o início das tratativas entre a EAF e as empresas integrantes do Consórcio Operador Neutro, com vistas à operacionalização do uso antecipado da infraestrutura da Infovia 02	15661979
46	20/2026/GAISPI-ANATEL	08/06/2026	EAf	Atividades do GT-F, prorrogações de prazos e Relatório Financeiro 1º trimestre 2026	15686272
47	22/2026/GAISPI-ANATEL	01/06/2026		Solicita manifestação da EAF em relação ao Ofício nº 20151/2026-TCU/Seproc	15726115
48	23/2026/GAISPI-ANATEL	09/06/2026	AUD	Encaminha resposta ao Ofício nº 119/2026/AUD-ANATEL com os subsídios solicitados pelo TCU por meio do Ofício nº 20151/2026-TCU/Seproc	15764313
49	24/2026/GAISPI-ANATEL	10/06/2026	EAf	Deferimento de pedido de prorrogação de prazo para encaminhamento integral das informações requeridas por meio do Ofício nº 18/2026/GAISPI-ANATEL	15772879
50	25/2026/GAISPI-ANATEL	15/06/2026	PFE-ANATEL	Consulta sobre distribuição e instalação de kits de recepção de TV no período de Defeso Eleitoral	15797727
51	26/2026/GAISPI-ANATEL	15/06/2026	Secretário-Executivo do Ministério das Comunicações	Solicitação de Informações aos questionamentos formulados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no âmbito da diligência constante do Ofício nº 017530/2026-SEPROC	15806187

Nº	Reunião	Data	Destinatário	Objeto (síntese)	Nº SEI
52	27/2026/GAISPI-ANATEL	16/06/2026	EAF	Requisição de informações sobre posição dos recursos financeiros da EAF e respectivas aplicações	15816320
53	28/2026/GAISPI-ANATEL	23/06/2026	CGU	Solicitação de subsídios para a elaboração de resposta à Solicitação de Auditoria nº 10 da Controladoria-Geral da União (CGU)	15830366
54	30/2026/GAISPI-ANATEL	29/06/2026	EAF	Solicitação de encaminhamento de report periódico ao GAISPI com síntese das deliberações do Conselho Deliberativo	15832956
55	32/2026/GAISPI-ANATEL	24/06/2026	EAF	Solicitação para adoção das providências cabíveis visando viabilizar o início das tratativas entre a EAF e as empresas integrantes do Consórcio Operador Neutro, com vistas à operacionalização do uso antecipado da infraestrutura da Infovia 02	15852761
56	33/2026/GAISPI-ANATEL	26/06/2026	EAF	Solicitação de subsídios para atendimento à Solicitação de Auditoria nº 02 da Controladoria-Geral da União (CGU)	15873672
57	36/2026/GAISPI-ANATEL	02/07/2026	EAF	Revisão dos critérios técnicos e das especificações da camada de criptografia da Rede Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal (RPC-APF), em face do Ofício nº 14998/2026/MCOM, com retorno ao GAISPI para avaliação de aderência	15900507
58	38/2026/GAISPI-ANATEL	03/07/2026	EAF	Solicita subsídios para elaboração de resposta ao Ofício nº 24873/2026-TCU/Seproc	15913144
59	39/2026/GAISPI-ANATEL	06/07/2026	EAF	Requisição de informações e documentos complementares ao Ofício nº 38/2026/GAISPI-ANATEL	15917213
60	40/2026/GAISPI-ANATEL	07/07/2026	Secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações	Prestação de informações acerca da conformidade jurídica da continuidade do Programa “Brasil Antenado” durante o período de defeso eleitoral	15920212
61	42/2026/GAISPI-ANATEL	09/07/2026	EAF	Continuidade da execução do Programa “Brasil Antenado” durante o período de defeso eleitoral – comunicação para dar prosseguimento e cautelas à Entidade Administradora da Faixa (EAF)	15938932
62	43/2026/GAISPI-ANATEL	13/07/2026	EAF	Deferimento de pedido de prorrogação de prazo para envio dos subsídios solicitados pelo Ofício nº 39/2026/GAISPI-ANATEL	15952998
63	44/2026/GAISPI-ANATEL	13/07/2026	EAF	Encaminha o Ofício nº 2026001DF, contendo Notificação Extrajudicial encaminhada pela empresa PADTEC S.A., para conhecimento e adoção de providências cabíveis	15954669

10. Entregas acompanhadas no ciclo 2025–2026

10.1. Migração TVRO e desocupação FSS (Nível A – atestado)

A conclusão das atividades de migração TVRO e de desocupação e mitigação de interferências nas estações FSS foi objeto do atesto descrito no Capítulo 7, constituindo o resultado de maior grau de verificação do ciclo.

A plena implantação do 5G na faixa de 3,5 GHz consumou-se com a preservação da recepção gratuita de TV aberta e dos serviços das exploradoras de satélite.



10.2. Infovias Amazônicas – PAIS Norte Conectado (Níveis B e C)

Posição reportada pela EAF com data-base de 29 de maio de 2026:

Infovia 02 (Rio Solimões) 100%

Implantação concluída. Vistorias e patrimonialização finalizadas. Minuta de Termo de Declaração e Entrega - TDE em apreciação junto a Anatel/MCom. Solicitação do uso precário em andamento.

Infovia 04 (Rio Branco) 100%

Implantação concluída. Integração ativada pela RNP. TDE de 23/04/2026. Passagem da Infovia para o operador Neutro em andamento.

Infovia 05 (Rio Madeira) 50%

Em execução. Licenciamento e cessões de uso em andamento.

Infovia 06 (Rio Purus) 30%

Em execução. Estudo de Rota Aprimorada concluído em 17/05/2026.

Infovia 03 (Foz do Amazonas) 100%

Implantação concluída. TDE de 23/04/2026, em uso precário por 12 provedores. Passagem da Infovia para o operador Neutro concluída.

Infovia 08 (Rio Juruá) 26%

Em execução. Estudo de Rota Aprimorada concluído em 12/05/2026.

Revitalização do PAC 87%

Em execução a adequação e a recuperação das infovias do PAC-1 e PAC-2, para assegurar a integração plena com Infovia 02.

Içá/Putumayo (Brasil/Colômbia) 100%

Estudo hidrográfico de viabilidade Içá/Putumayo concluído.

A Etapa 01(Infovias 02, 03 e 04) encontra-se integralmente implantada, com transferências ao Ministério das Comunicações em curso (Infovia 02) ou concluídas (Infovias 03 e 04). No ciclo, registrou-se ainda a maior operação logística de transferência de cabos de fibra óptica já realizada no âmbito do programa, destinada às Infovias 05, 06 e 08. Para a Infovia Içá/Putumayo (Brasil/Colômbia), o compromisso é somente da realização do estudo hidrográfico de viabilidade, o qual já está concluído.

O modelo subfluvial de implantação – lançamento dos cabos no leito dos rios – dispensa grandes obras terrestres e evita supressão de vegetação em áreas sensíveis, característica ambiental relevante do programa.





10.3. Brasil Antenado – Fase Extra (Níveis B e C)

Considerando-se a data-base de 30/06/2026, a Fase Extra do programa alcançou o acumulado de 257.564 instalações, distribuídas entre as três etapas (Nível C). No ciclo, o GAISPI deliberou sobre a continuidade do programa durante o período de restrições eleitorais, limitada ao estoque de equipamentos já adquiridos e aos municípios já autorizados, na forma da manifestação da Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel, e determinou a reserva de recursos para a Fase C (Nível B).

Fase A	Instalações 72.924	Penetração 34,4%
Situação (29/05/2026): Agendamentos encerrados em 13/12/2025		
Fase B	Instalações 83.453	Penetração 36,8%
Situação (29/05/2026): Agendamentos encerrados em 13/03/2026		
Fase C	Instalações 101.187	Penetração 46%
Situação (29/05/2026): Agendamentos encerrados em 13/06/2026		
Acumulado	Instalações 257.564	
Fase Extra consolidada no período		

10.4. Rede Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal

No ciclo, o GAISPI exerceu sua competência de definição de especificações adicionais, critérios técnicos e diretrizes para a implantação da Rede Privativa (art. 3º, XVII, do RI), inclusive quanto à camada criptográfica da rede. A execução dos processos de contratação correspondentes é de responsabilidade da EAF, no âmbito de sua governança interna.

No período considerado, destaca-se a implantação da plataforma MCPTx (missão crítica) da rede privativa, concluída em abril de 2026. Tal plataforma permitiu a integração entre a maior parte das redes legadas dos órgãos de segurança do Distrito Federal, tais como Polícia Militar do DF, Detran/DF, Corpo de Bombeiros do DF, SAMU/DF, Senado e Câmara Federal, Exército, Marinha e Aeronáutica. Com isso, teve início o período de testes de um ano junto aos órgãos de segurança pública. A rede da Polícia Federal não pode ser integrada por motivos técnicos e será objeto de reavaliação.

Rede Fixa

Rede Metropolitana **84%**

Implantação de 1340 km de fibra óptica e equipamentos finalizada em 25 Capitais e DF em dezembro de 2025. O lançamento da rede de SP está em estágio inicial e terá 260 km de fibra.

Rede de Acesso **89%**

Rede de Acesso finalizada em 23 capitais e DF. Manaus, Cuiabá e São Paulo encontram-se em fase inicial.

Pontos de Presença **74%**

80 de 108 Pontos de Presença (pontos de distribuição) concluídos.

Rede Móvel

Integração das redes legadas **100%**

Implantação da integração entre as redes de rádio (LMR) de órgãos de segurança pública do DF (incluindo órgãos federais).

Rede LTE **0%**

Concluída a integração entre as redes legadas, terá início a implantação de rede LTE (4G/5G), por meio da qual serão disponibilizadas novas funcionalidades para os órgãos de segurança, como streaming de áudio e vídeo, envio de dados, acesso à internet, geolocalização e outros.

Criptografia

Algoritmo de Estado **100%**

Desenvolvimento de algoritmo de criptografia concluído pela ABIN, resultado de ACT celebrado entre a entidade, Anatel e MCOM. Novo ACT terá como objeto a implantação nos equipamentos de criptografia (encriptadores).

Encriptadores **0%**


Aquisição e implantação dos encriptadores. RFP inicial foi cancelada em virtude da revisão da demanda pela Telebras.

10.5. Modernização do backbone da Telebrás exemplo de ato parametral

A atuação do GAISPI na modernização do backbone da Telebrás, voltada ao atendimento da Rede Privativa em sua componente de rede fixa, ilustra com precisão a natureza finalística e paramétrica do controle exercido. Provocado pelo Ofício nº 42.698/2025/MCOM, de 4 de dezembro de 2025, o GAISPI deliberou, em sua 45ª Reunião Ordinária (19 de dezembro de 2025), autorizar a EAF a realizar análise técnica complementar e estimativa de custos sobre as alternativas de adequação e capacitação dos backbones IP e DWDM, com vistas a subsidiar a definição da solução mais adequada.

O ato do GAISPI limitou-se a autorizar a realização do estudo e referendar a escolha da alternativa apontada pela EAF, estabelecendo que o processo deve ser isonômico e permitir a participação de quaisquer fornecedores.

A condução da análise técnica, a avaliação das alternativas e as decisões de contratação permanecem na esfera de governança da EAF. É o desenho paradigmático do controle paramétrico: o GAISPI fixa o parâmetro e delimita o objeto do estudo; a entidade executora analisa, decide e executa (Nível B).

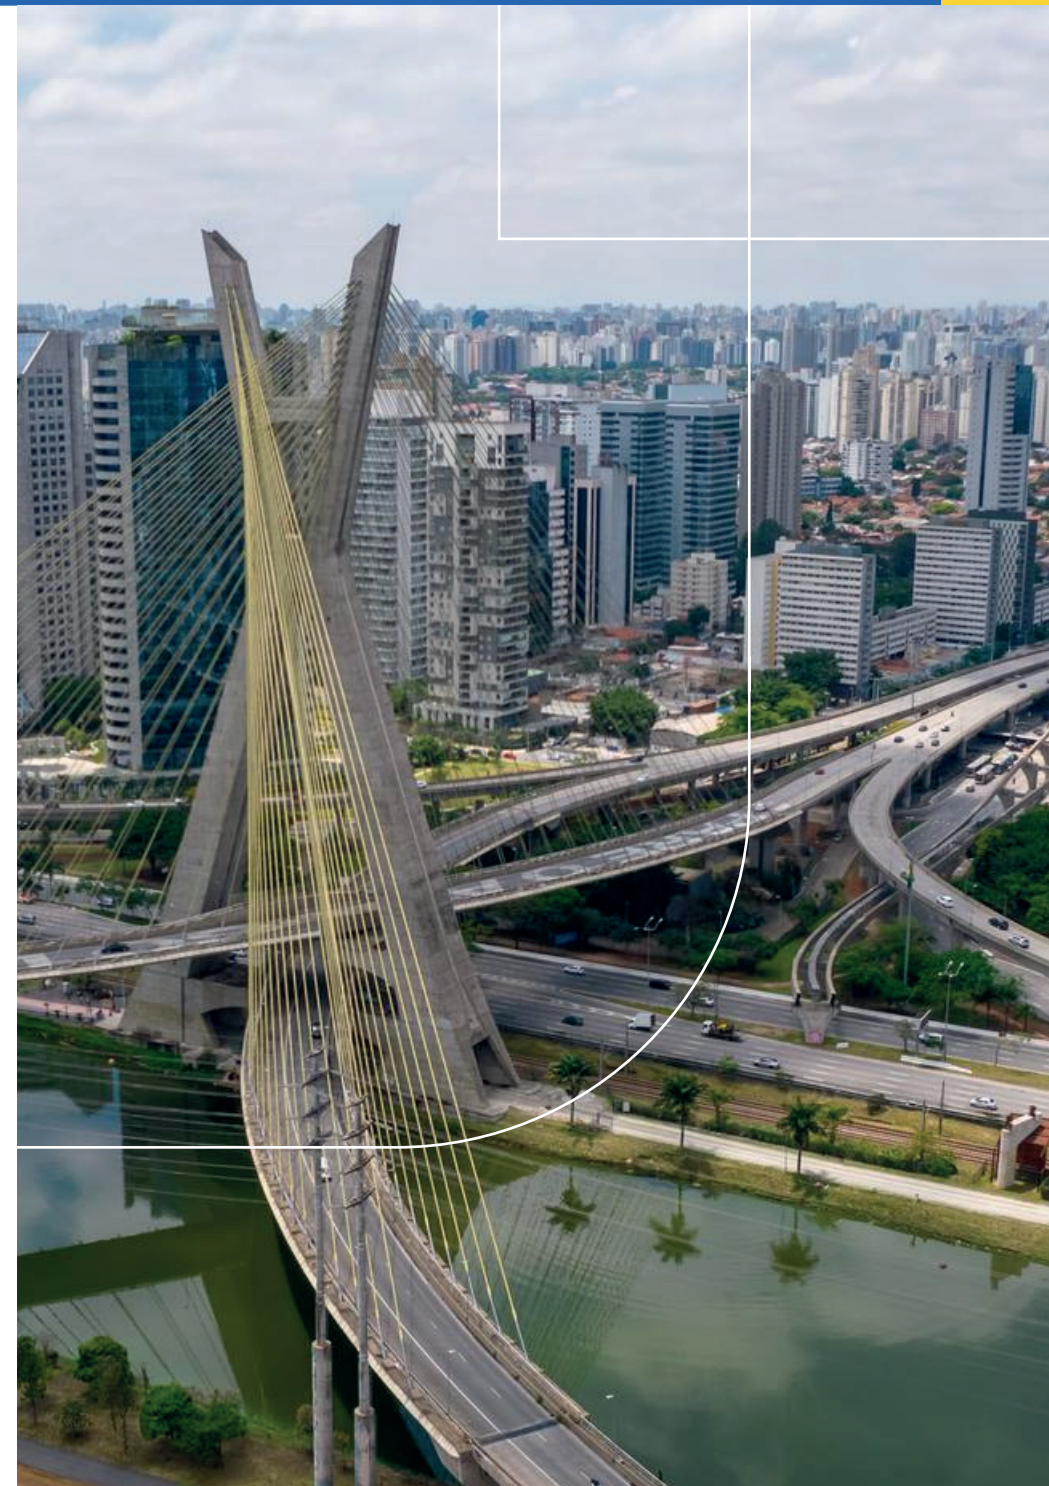

11. ESG, Sustentabilidade Operacional, Cidadania Digital e desenvolvimento de capacidades

11.1. Marco de referência

No ciclo 2025–2026, a agenda socioambiental da EAF avançou das ações de mitigação ambiental e gestão de resíduos para iniciativas de formação técnica, cidadania digital e desenvolvimento de capacidades locais, especialmente nos territórios atendidos pelas Infovias Amazônicas.

Essas iniciativas buscam ampliar os benefícios associados à infraestrutura implantada, promovendo seu uso seguro, produtivo e adequado às necessidades das comunidades atendidas. A EAF passou a organizar essas frentes sob a estratégia socioambiental “Norteia”, estruturada nos eixos de educação, saúde, cultura, social e ambiental.

Os resultados são classificados como Nível C, por corresponderem a informações reportadas pela EAF.

11.2. Gestão de resíduos eletrônicos

O Edital de Apoio à Gestão de Resíduos Eletrônicos destinou R\$ 1 milhão a dez projetos executados nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Conforme reportado pela EAF, as iniciativas alcançaram os seguintes resultados no ciclo:

- atuação em 29 cidades;
- ações de educação ambiental em 110 escolas;
- coleta e destinação adequada de 38 toneladas de resíduos eletroeletrônicos;
- capacitação de 400 catadores pelo Programa Catador Digital;
- formação de 30 alunos em recondicionamento de computadores, em parceria com o SENAI; e
- recondicionamento de mais de 50 equipamentos de informática.

Os resultados são classificados como Nível C, por corresponderem a informações reportadas pela EAF.



11.3. Cidadania digital e participação institucional

Por meio do Projeto Terra Preta — Cidadania Digital, ocorreu a realização de ações voltadas a comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas e demais públicos dos territórios das Infovias, abordando o uso seguro da internet, cidadania digital, comunicação comunitária, acesso a serviços públicos e valorização de conteúdos e saberes locais.

No ciclo, foram realizadas dez oficinas em localidades ao longo das Infovias 02, 03 e 04, além do 1º Encontro Pan-Amazônico, realizado em Abril/26 em Tefé, conforme reportado pela EAF.

Na COP30 (Belém), ocorreu a participação institucional da EAF em atividades relacionadas à conferência, com apresentação das experiências do Norte Conectado e do Projeto Terra Preta e discussão sobre conectividade, sustentabilidade e inclusão digital na Região Amazônica.

Os resultados são classificados como Nível C, por corresponderem a informações reportadas pela EAF.

11.4. Programa Mil Talentos

Formação regional e sustentabilidade operacional

Por meio do Ofício nº 05/2026/GAISPI-ANATEL, o GAISPI determinou à EAF a avaliação e apresentação de proposta de formação de capital humano regional voltada ao suporte operacional das Infovias Amazônicas, no exercício de sua competência parametral (art. 3º, XVII e art. 23, II, do RI).

Trata-se de ato parametral do GAISPI, classificado como Nível B, por meio do qual o Grupo estabeleceu a necessidade de formação regional, cabendo à EAF estruturar e executar a proposta.

Em atendimento, a EAF estruturou o Programa Mil Talentos, cuja proposta contempla:

- **oferta de 1.000 vagas** para formação profissional.
- **Implantação em seis polos regionais** (Manaus, Belém, Porto Velho, Macapá, Boa Vista e Rio Branco).
- **700 vagas em cursos de curta duração** (até 60 horas).
- **300 vagas em cursos de longa duração** (até 900 horas).
- **Prazo estimado de execução de 24 meses.**
- **Investimento estimado de R\$ 6,2 milhões.**

A iniciativa tem como objetivo ampliar a disponibilidade de profissionais qualificados na região, contribuindo para a sustentabilidade operacional das Infovias e para o desenvolvimento de capacidades técnicas locais.

Sob a perspectiva da avaliação regimental, o programa articula três dimensões:

- **Formação técnica e desenvolvimento de competências:** qualificação de profissionais para atividades relacionadas à operação, manutenção, monitoramento e suporte das Infovias Amazônicas;
- **Desenvolvimento de capacidades locais:** ampliação da oferta de formação profissional nos territórios atendidos, com potencial de contribuir para a empregabilidade e a geração de renda; e
- **Sustentabilidade operacional das Infovias:** formação de profissionais na própria região, contribuindo para ampliar a disponibilidade local de mão de obra qualificada e para a continuidade da infraestrutura implantada.

Os resultados são classificados como Nível C, por corresponderem a informações reportadas pela EAF.

12. Avaliação da adequação das atividades da EAF aos seus objetivos (art. 3º, XXIV)

12.1. Parâmetro de avaliação

A avaliação toma por parâmetro os objetivos da EAF definidos no Edital nº 1/2021 e em seu Estatuto Social: a execução das obrigações de mitigação de interferências (TVRO e FSS) e dos projetos associados (PAIS/Norte Conectado, Rede Privativa e demais), com gestão eficiente, íntegra e transparente dos recursos aportados pelas proponentes vencedoras.

No eixo ESG, a avaliação considera a contribuição das iniciativas para a sustentabilidade operacional das Infovias Amazônicas, para a formação técnica regional, para o uso seguro e produtivo da conectividade e para a gestão responsável dos impactos socioambientais associados às atividades da EAF, observados os níveis de verificação definidos neste Anuário.



12.2. Avaliação por eixo

Eixo	Avaliação	Fundamentos (síntese)
Migração TVRO / desocupação FSS	Adequada – obrigação adimplida	Atesto de 26/06/2026, com auditoria independente (Nível A).
Infovias Amazônicas (PAIS)	Adequada Etapa 1 (Infovias 02, 03 e 04) concluída. Etapa 2 (Infovias 05, 06 e 08) em execução	Infovia 02 (Tefé-Atalaia do Norte/Rio Solimões) - Implantação concluída. Infovia 03 (Macapá-Belém/Foz do Amazonas) - 100% Concluída. Infovia 04 (Vila de Moura-Boa Vista/Rio Branco) - 100% Concluída. Infovia 05 (Autazes-Porto Velho/Rio Madeira) - Em execução: 50% Concluída. Infovia 06 (Rio Purus) - Em execução: 30% Concluída. Infovia 08 (Rio Juruá) - Em execução: 26% Concluída. Revitalização PAC - Em execução: 87% Concluída. Infovia Içá/Putumayo (Brasil/Colômbia) - Estudo hidrográfico 100 % Concluído.
Brasil Antenado	Adequada – obrigação adimplida	Último agendamento realizado em 13/06/2026, conforme prazo definido na 44ª RO.
Rede Privativa	Adequada – obrigação em execução e dentro do cronograma	Maior parte das redes metropolitanas e de acesso concluídas. Implantação de PoPs em percentual avançado. Integração das plataformas de missão crítica legadas concluídas (à exceção da Polícia Rodoviária Federal, por motivos técnicos).
Governança e integridade	Adequada – obrigação adimplida em 16.12.2025 (Nível C)	A reforma do Estatuto Social, consumada em 16/12/2025, institucionalizou a segregação de funções na EAF para mitigar conflitos de interesses. A nova estrutura de governança baseia-se na atuação de órgãos independentes das Associadas: o Conselho Deliberativo, instalado em 19/12/2025 com Regimento Interno aprovado em 29/01/2026, que realiza deliberações estratégicas mensais; e o Conselho Fiscal, instalado em 16/06/2026, responsável, dentre outras atribuições, pela análise técnica das demonstrações financeiras. A gestão é executada por uma Diretoria técnica e desvinculada das operadoras, apoiada por sistemas de gestão de riscos e procedimentos de preservação da governança.
ESG, Sustentabilidade Operacional e Capital Humano	Adequada – obrigação em execução e dentro do cronograma (Nível C)	O Programa Mil Talentos tem como objetivo qualificar profissionais residentes na Região Amazônica para atividades relacionadas à operação, manutenção e suporte das Infovias. De forma complementar, a Estratégia Norteia organiza e integra as iniciativas socioambientais da EAF nos eixos: educação, saúde, social, ambiental e cultural. O Edital de Apoio à Gestão de Resíduos Eletrônicos promoveu ações de educação ambiental, coleta e destinação adequada de resíduos eletrônicos em 29 Municípios de cinco Estados da Região Nordeste. O Projeto Terra Preta, por sua vez, desenvolveu ações de cidadania digital, comunicação comunitária e uso crítico e seguro da conectividade nos territórios relacionados às Infovias. Todas essas iniciativas são enquadradas como ações de legado funcional vinculadas à sustentabilidade e utilização dos ativos pelas populações beneficiadas pelos projetos.
Gestão financeira	Parcialmente Adequada – obrigação adimplida parcialmente	- Relatórios econômico-financeiros apresentados trimestralmente. - Relatório anual de auditoria referente a 2025 apresentado em 22/jun/2026. - Atualização do planejamento financeiro não apresentada.

12.3. Conclusão da avaliação

No que tange à gestão financeira, o Grupo Técnico de Acompanhamento Financeiro (GT-F) tem realizado acompanhamento periódico de informações financeiras apresentadas pela EAF, conforme estabelecido no Regimento Interno do GAISPI. Embora não tenha sido apresentada a atualização do planejamento financeiro para 2026, as informações constantes nos demais relatórios têm sido suficientes para a verificação do cumprimento das obrigações editais referentes à gestão dos recursos financeiros da entidade.

Quanto ao eixo ESG, sustentabilidade operacional e capital humano, as iniciativas desenvolvidas e estruturadas no ciclo mostram-se aderentes aos objetivos da EAF e aos projetos por ela executados. Destaca-se o Programa Mil Talentos, solicitado pelo GAISPI e diretamente relacionado à formação regional necessária ao suporte e à continuidade operacional das Infovias Amazônicas. As ações de gestão de resíduos eletrônicos e cidadania digital complementam essa atuação ao promover a gestão responsável de impactos socioambientais e o uso seguro e produtivo da conectividade. Considerando os diferentes níveis de verificação, os resultados de execução deverão permanecer sujeitos a acompanhamento, comprovação e adequada identificação de suas fontes.

Em relação às Infovias Amazônicas PAIS, a Etapa 01 (Infovias 02, 03 e 04) encontra-se integralmente implantada, com transferências ao Ministério das Comunicações em curso (Infovia 02) ou concluídas (Infovias 03 e 04). A Infovia 05 teve o início do lançamento do cabo óptico subaquático em 20/07/2026, enquanto as Infovias 06 e 08 se encontram nos estágios de planejamento prévio, com previsão para implantação em 2027-2028.

Quanto à rede privativa da administração pública federal, observou-se um avanço considerável na execução das atividades de implantação no período considerado. Verifica-se que as redes metropolitanas e de acesso, que compõe a rede fixa, estão em fase final de instalação, com previsão de entrega da maior parte ainda esse ano (2026). Para a rede móvel, destaca-se a conclusão da integração entre as redes legadas dos órgãos de segurança pública, tendo se iniciado o período de testes. Mostrando-se viável, a expectativa é que se dê início na implantação da rede LTE, que permitirá a oferta de uma maior gama de funcionalidades. Para a camada de criptografia, o desenvolvimento do algoritmo foi concluído pela ABIN e a celebração de um novo ACT permitirá dar sequência à efetiva implementação nos encriptadores a serem implantados na rede fixa.

Para as obrigações de Mitigação e Desocupação, há a previsão editalícia da EAF atender eventuais ocorrências de interferência nas estações terrenas da Banda C na etapa de mitigação preventiva. Até o presente momento, a EAF não foi acionada para resolver problemas de interferência causadas por estação terrestre do SMP na faixa de 3,5 GHz.

E por fim, para as obrigações editalícias da migração da TVRO da Banda C para a Banda Ku, todas as atividades foram finalizadas, com a instalação de mais de 5 milhões de kits instalados. Esse cumprimento da obrigação possibilitou a ampliação do escopo da migração da TVRO para que, nos 323 municípios estabelecidos na Portaria MCOM nº 17337/2025, a exigência de que o beneficiário tenha a TVRO na Banda C funcionando fosse excluída. Essa ampliação dos municípios com baixo atendimento de TV terrestre, cujo último agendamento foi finalizado em 13/06/2026, resultou na instalação de mais de 257 mil kits.

13. Riscos e pendências identificados

Conforme reportado neste anuário, algumas atividades ainda seguem em andamento e sua execução depende de fatores que não são de controle do GAISPI.

Cita-se o caso do projeto PAIS, cuja Etapa 02 das Infovias 05, 06 e 08 se encontra em execução. Na Infovia 05 já se iniciou o lançamento do cabo óptico subaquático em 20/07/2026, enquanto as Infovias 06 e 08 se encontram nos estágios de planejamento de rota, com previsão para implantação em 2027-2028. A conclusão plena das três infovias da Etapa 02 estão sujeitas às condições de navegabilidade dos respectivos rios, o que pode atrasar o cronograma inicialmente previsto.

No que diz respeito à rede privativa de comunicação da administração pública federal, o principal ponto de atenção recai sobre a fase 2 da rede móvel que, a pedido do Ministério das Comunicações, se encontra atualmente suspensa para a reavaliação da sustentabilidade econômica do modelo desenhado na Nota Técnica nº 10.131/2024/SEI-MCOM. Eventual revisão do modelo poderá se mostrar em descompasso com o que foi previsto no Edital do 5G, o que poderá demandar avaliação, pelo GAISPI, dos seus impactos em relação ao previsto originalmente no Edital.

14. Conclusão

O ciclo 2025-2026 consolidou a maturidade do modelo de governança instituído pelo Edital do 5G. A verificação conclusiva do adimplemento das obrigações de migração TVRO e de desocupação FSS, com a consequente liberação de garantias na ordem de R\$ 3,9 bilhões e a preservação prudencial de recursos para as etapas remanescentes, demonstrou o funcionamento do controle finalístico em sua expressão mais acabada: parâmetros claros, verificação independente e reconhecimento formal de resultados.

A reestruturação da governança da EAF, por sua vez, fortaleceu as condições institucionais para que a entidade executora conclua, com integridade e autonomia, as obrigações ainda em curso.

Este Anuário é encaminhado ao Conselho Diretor em cumprimento ao art. 3º, XXIV, do Regimento Interno, e ficará disponível como registro institucional do ciclo, sem prejuízo dos instrumentos ordinários de fiscalização e das avaliações subsequentes.

Fontes

- Edital nº 1/2021-SOR/SPR/CD-Anatel e anexos;
- Portaria Anatel nº 2.774/2024 – Regimento Interno do GAISPI;
- Estatuto Social da EAF, consolidado na AGE de 16/12/2025;
- Atas e despachos do GAISPI – ciclo jul/2025 a jul/2026;
- Relatórios da EAF – Siga Antenado, Brasil Antenado, Infovias Amazônicas (posição de 09/06/2026) e agenda socioambiental;
- Relatórios de auditoria independente de suporte aos atestos;
- Manifestações da Superintendência de Controle de Obrigações – SCO; e
- Divulgações do Ministério das Comunicações sobre o programa Norte Conectado (2026).

